



वार्षिक प्रगति, असल अभ्यास र सिकाई सम्बन्धी
अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम




शिवालय गाउँपालिका
जाजरकोट, कर्णाली प्रदेश

मिति: २०८२/०९/१६
(स्थान: खलंगा, जाजरकोट)

प्रस्तुतकर्ता
गोपाल शाही
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोटको नक्शा

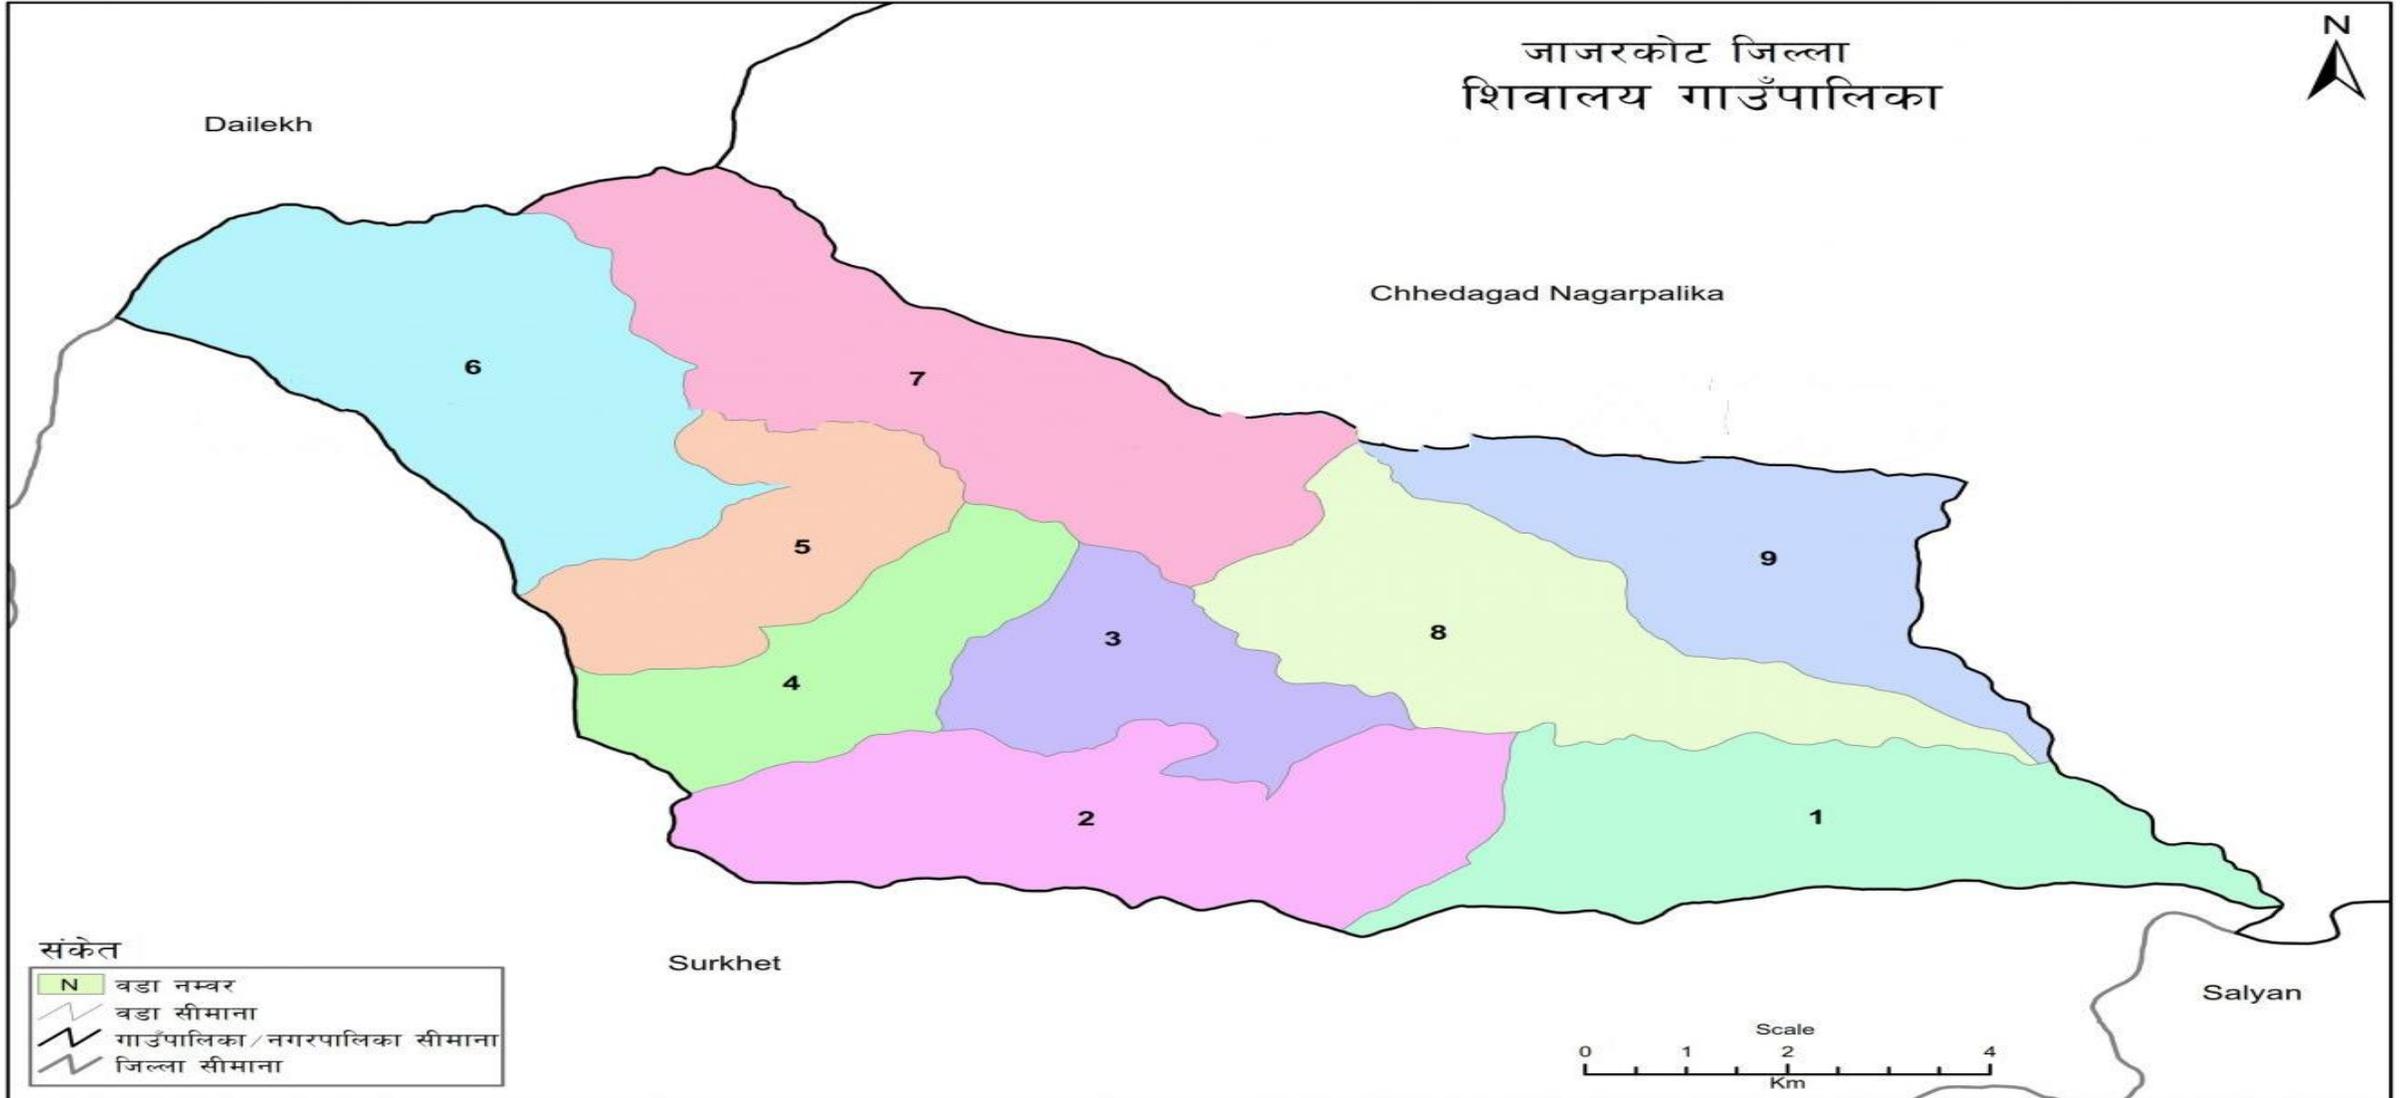



शिवालय गाउँपालिकाको परिचय



स्थानीय तहको नाम: शिवालय गाउँपालिका

गाउँपालिकाको केन्द्र: वडा नं.-३, सिमा, जाजरकोट

क्षेत्रफल: १३४.२६ वर्ग कि.मि.

जनसंख्या: १४,७७६ (राष्ट्रिय जनगणना, २०७८)

उचाई: समुन्द्री सतहबाट न्यूनतम ७४४ मिटर देखि अधिकतम २९७६ मिटर सम्म

पुर्व: छेडागाड नगरपालिका

पश्चिम: सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका

उत्तर: दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका

दक्षिण: भेरी नदी र सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका

जम्मा वडा संख्या: ९ (साविक ३ गा.वि.स.)

पर्यटकिय स्थल: शिवालय, मालिका, चिनेकम्द, कचाली, छेडाखोला आदि

धार्मिक क्षेत्रहरु: मौला, रम्माला, मस्टो, बटुक भैरब आदि

सम्भावना: कृषि, पर्यटन, उधोग आदि।



स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण



सि.नं.	विवरण	अवस्था
१.	जनशक्ति व्यवस्थापन	क. जम्मा स्वीकृत दरवन्दी: ६५ कास बाहेक पदपूर्ति: ४६ कास सहित रिक्त: १९ कास बाहेक ख. कर्मचारी समायोजन पश्चात O & M सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन स्वीकृत: प्रतिवेदन तयार भएको स्वीकृत हुन बाँकी।
२.	प्रशासकीय भवन र पहुँच	क. प्रमुख प्रशासकीय भवन: नबनेको (निर्माणाधीन) ख. आफ्नै वडा कार्यालय: भएको वडा संख्या: ४ नभएको वडा संख्या: ५ (वडा नं. १, ३, ४, ५ र ६ निर्माणाधीन) ग. वडा केन्द्रसम्म सडक पुगेको वडाको संख्या: ९ नपुगेको वडा संख्या: ० घ. १० शैया अस्पताल: निर्माणाधीन ङ. स्वास्थ्य संस्था: ३ स्वास्थ्य चौकी, ६ आस्वासेके, ३ बर्थिङ्ग सेन्टर (२ बर्थिङ्ग सेन्टर, २ सास्वासेइ, १ आस्वासेके)
३.	कानून निर्माणको अवस्था	क. ऐनको संख्या: ९ ख. नियमावलीको संख्या: ३ ग. कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिकाको संख्या: ५१
४.	विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था	क. आवधिक योजना: बनेको (अद्यावधिक हुन बाँकी)। ख. वार्षिक बजेटसँगै तोकिएको ढाँचा अनुरूप मध्यमकालिन खर्च संरचना: नबनेको। ग. स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण: बनेको (अद्यावधिक हुन बाँकी)। घ. भूउपयोग योजना: नबनेको। ङ. स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड: बनेको। च. राजस्व सुधार कार्ययोजना: बनेको। छ. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: नबनेको।



स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण



सि.नं	विवरण	अवस्था
५.	स्थानीय तहको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको प्रयोग	क. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क: ७३ (आ.व. २०८०।८१) ख. स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क: ६९
७.	न्यायिक समिति सम्बन्धी	क. दर्ता भएका उजुरी/गुनासो संख्या: ३ ख. सरि आएका: ७ ग. कारवाही वा फछ्यौट भएका उजुरी संख्या: ६ घ. फछ्यौट हुन बाँकी उजुरी संख्या: ३ ड. जिल्ला अदालत सिफारिस गरिएको: १
८.	वेरुजु सम्बन्धी	क. आ.व. २०८०/८१ सम्मको कायम कुल वेरुजु रकम: २९,१०,९३,००० ख. आ.व. २०८१/८२ मा फछ्यौट भएको वेरुजु रकम : ० ग. आ.व. २०८१/८२ सम्मको फछ्यौट गर्नुपर्ने कुल वेरुजु रकम (रु. हजारमा): २९,१०,९३,०००
९.	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	क. दमकल सेवाको उपलब्धता: नभएको ख. फोहोर प्रशोधन केन्द्र: नभएको ग. स्यानीटरी ल्याण्डफिल साईट: नभएको



स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण



सि.नं.	विवरण	अवस्था
१०.	सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिता	क. अनलाईन मार्फत प्रदान गरिएको सेवाको संख्या: ७ ख. नागरिक वडापत्र: भएको ग. सूचना अधिकारी: तोकेको घ. गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था: भएको ङ. निगरानी निकाय तथा कार्यालयमा प्राप्त उजुरी/गुनासो संख्या: ० फछ्यौट संख्या: ०
११.	अभियानमूलक कार्यक्रम	क. बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: ० ख. पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: ० ग. बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: ० घ. पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणा: २ ङ. पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा: भएको



आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण



शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी %	खर्च रकम	खर्च %	कै
१. संघीय सरकार	२७३१७५०००	२४६५५४७१७.३८	९०.२६			
१.१ समानिकरण अनुदान	७५००००००	६८८२००००	९१.७६			
१.२ शसर्त अनुदान चालु	१७५३७५०००	१५७६३८८६८.३८	८९.८९			
१.३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	५८००००००	३६३९८५६	६२.७६			
१.४ विशेष अनुदान पुँजीगत	१७०००००००	१६४५५९९३	९६.८			
२. प्रदेश सरकार	६७०९०००००	४७९०१२७८	७१.४			
२.१ समानिकरण अनुदान	७७१५०००	७७१५०००	१००			
२.२ शसर्त अनुदान चालु	१८७५०००	१३०२१०५	६९.४५			
२.३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	३१५००००००	२९७५६८४२	९४.४७			
२.४ विशेष अनुदान चालु	६०००००००	५९९७७९४	९९.९६			
२.५ समपुर अनुदान पुँजीगत	२००००००००	३१२९५३७	१५.६५			



आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण



शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी %	प्रस्तावित खर्च	वास्तविक खर्च	खर्च%
३. राजस्व बाँडफाड	८३३७७६४७	७४६५१४१८.५१	८९.५३			
३.१ मुल्य अभिवृद्धि कर	६०६६४५५६	५३६७६३४४.३०	८८.४८			
३.२ अन्त शुल्क	२२०३५४४४	२०१३४२१७.०५	९१.३७			
३.३ सवारी साधन कर	६७७६४७	८४०८५७.१६	१२४.०८			
४. आन्तरिक श्रोत	३६७१९३९८.३१	३५२५२१३७.९६	९६			
४.१ कर तथा सेवा शुल्क	३००००००	१५५२७३९.६५	५१.०९			
४.२ बैंक मौज्जात	३३७१९३९८.३१	३३७१९३९८.३१	१००			
जम्मा	४६०३६२०४५.३१	४०४३५९५५१.८५	८७.८३	४६०३६२०४५.३१	३७४२५३२६२.९०	८१.२९



आ.व. २०८१/०८२ को चालु र पूँजीगत बजेट खर्चको विवरण



शीर्षक	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
चालु बजेट	३२३८६१०००	२७६५६५०००	८५.३९	
पूँजीगत बजेट	१३६५०००००	९७६८७०००	७१.५६	
जम्मा बजेट	४६०३६२०४५	३७४२५३२६२.९०	८१.२९	



आ.व. २०८१।०८२ को क्षेत्रगत बजेट विनियोजन तथा खर्च



सि.नं.	विषय क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	आर्थिक विकास	१३४९१०००	९३७८६६९	६९.५२	
२.	सामाजिक विकास	२२३१४९५७३	१९४४५४४८६.३८	८७.१४	
३.	पूर्वाधार विकास	८०७५००००	५७१३८११८	७०.७६	
४.	सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र	५०८९३८२५.३१	३५५९८७६०	६९.९५	
५.	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	९२०७७६४७	७७६८३२२९.५२	८४.३७	
	जम्मा	४६०३६२०४५.३१	३७४२५३२६२.९०	८१.२९	



स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको विवरण



बजेटको आधारमा:

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/०८२ को योजना संख्या
१.	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	५
२.	२५+ देखि ५० लाखसम्मको आयोजना	१३
३.	५+ देखि २५ लाखसम्मको योजना	१९
४.	५ लाखसम्म बजेटको आयोजना	६२
	जम्मा	९९

कार्यान्वयन तह/क्षेत्रको आधारमा:

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/०८२ को योजना संख्या
१.	गाउँपालिका स्तरीय	३७
२.	वडास्तरीय	६२
	जम्मा	९९

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि:

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/०८२ को योजना संख्या
१.	उपभोक्ता समिति मार्फत	९५
२.	निर्माण व्यवसायी मार्फत	३
३.	अन्य	१
	जम्मा	९९



आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुख्य उपलब्धीहरु



सि.नं	सूचक	बेसलाईन आ.व. २०८०/०८१ सम्मको अवस्था	आ.व. २०८१/०८२ को प्रगति	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको अवस्था
१.	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (कालोपत्रे) कि.मी.	६.८	०	६.८
२.	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (खण्डास्मित) कि.मी.	८.९	११.५	२०.३
३.	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (धुले) कि.मी.	२६५.५	१७.७	२८३.२
४.	स्थानीय सडक पुल निर्माण (संख्या)	२	१	३
५.	झोलुङ्गे पुल निर्माण (संख्या)	१०	३	१३
६.	सिंचाई कुलो निर्माण (कि.मी.)	१२.८	१.८५	१४.६५
७.	सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल (हेक्टर)	११.५४	५४.३२	६५.८६
८.	स्थानीय तहमा दर्ता/सूचीकृत भएका उद्योग/फार्मको संख्या	१२	१२	२८
९.	सामुदायिक विद्यालयको (माथिल्लो तहमा भर्ना हुन योग्य हुनेगरी) SEE उत्तिर्ण दर	७१%	७१%	७१%
१०.	आधारभूत तहको खानेपानी पुगेको घरधुरी प्रतिशत	६९.५%	४.२५%	७३.७५%
११.	आधारभूत तहको सरसफाई पुगेको घरधुरी प्रतिशत	८५%	८५%	८५%
१२.	रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या		१६२२	



गाउँपालिकार LISP को सह-लगानीबाट संचालित योजना



S.N.	Schemes	Agreement Amount (Rs.)	Total Expenditure	Financial Progress %	Physical Progress %	Remarks
1.	Bhampa Aale Road Upgrading Scheme-01	3,132,317.92	3,079,101.056	98.30 %	100%	Drain-550m
2.	Shivalaya Khaneta road Upgrading Scheme-02	3,131,980.54	2,663,535.002	85.04 %	85%	Drain-100m,Gabin 254m3
3.	Khaneta Deuli Road Upgrading Scheme-03	2,634,174.14	2,535,037.888	96.24 %	98%	Drain-265m Gabin-
4.	Umaura Tata Road Upgrading Scheme-3,4	6,269,548.52	4,894,308.49	78.06 %	85%	Drain-500m Gabin-2
5.	Kalyana Chiuduwa Road Upgrading Scheme-05	3,132,534.11	2,733,307.487	87.26 %	95%	Drain-265 Gabin-
6.	Korchemule Lahare Sichai Kulo Nirman	3,134,705.87	2,977,874.03	95.00 %	100%	Canal-658m
7.	Kalyana Chinekumb Hudai Suyeda Road Upgrading-07	3,135,067.37	3,051,847.729	97.35 %	100%	Drain-30m RigidPavemetn-30m,
8.	Mailtada Lispani Road Upgrading Scheme-08	3,133,895.33	3,100,978.653	98.95 %	100%	Drain-550m
9.	Baluwa Badakanda Road Upgrading Schem-09	3,134,095.49	2,713,741.799	86.59 %	85%	Drain-605m
Grand Total		3.08 करोड	2.77 करोड	90%	94%	



गाउँपालिका र LISP को सह-लगानीबाट संचालित योजनाबाट प्राप्त उपलब्धी



क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण	कैफियत
१.	सडक नाली निर्माण	मिटर	२७६६	
२.	सिचाई कुलो	मिटर	६५८	
३.	ग्याविन जाली	घनमिटर	१४९७.५	
४.	पक्की सडक	मिटर	३७	
५.	रोजगारी सिर्जना	दिन	१२७०२	म. ८४९१, पु. ४२११



कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार योजना



क्र सं	आयोजनाको नाम	ठेगाना	स्वीकृत रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१.	ने रा मा वि पहिरो नियन्त्रण मुख्यमन्त्री रोजगार	शिवालय -१	१५ लाख	१००	१००	307cum
२.	आधारभुत स्वास्थ्य इकाई घेराबार	शिवालय -२	१५ लाख	१००	१००	150m
३.	वडा कार्यालय घेराबार निर्माण	शिवालय -३	१५ लाख	९८	९६	159m
४.	जामुने सिचाई कुलो तथा पोखरी निर्माण	शिवालय -४	१५ लाख	१००	९९	264m, 54m ³ , 1.2 hectare area
५.	पितरपुत्रा कुलबाधा खोला तटबन्ध निर्माण	शिवालय -५	१५ लाख	९८	९७	282m ³
६.	मालिका प्रा वि घेराबार निर्माण	शिवालय -६	१५ लाख	१००	१००	180m
७.	वडाखोला देखी खिरा सम्म सिचाई कुलो निर्माण	शिवालय -७	१५ लाख	१००	१००	1400m,54m ³
८.	वडा कार्यालय घेराबार निर्माण	शिवालय -८	१५ लाख	१००	१००	183m
९.	पाखापानी खडागाउँ कुलो निर्माण	शिवालय -९	१५ लाख	१००	९९	420m
जम्मा			१३५ लाख	९९.५६	९९	औ ६७.५ लाख ज्याला, ६७.५ जना*१००= ६७५० दिन रो सि



कर्णाली प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान योजना



क्र सं	आयोजनाको नाम	ठेगाना	स्वीकृत रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१.	ने रा मा वि भौतिक संरचना निर्माण	शिवालय -१	१० लाख	८०	७५	
२.	शिवालय क्याम्पस देखि रिटाइमेला अधिकारी टोल सडक निर्माण	शिवालय -२	२० लाख	८०	७५	
३.	३ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	शिवालय -३	३० लाख	१००	१००	
४.	५ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	शिवालय ५	२० लाख	१००	१००	
५.	६ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	शिवालय ६	२४ लाख	९०	८८	
६.	जाम्ना काँडाचौर वडापोखरा सडक	शिवालय -४	४० लाख	८०	७८	
७.	भुकम्प देखि क्षेत्रीग्रस्त शैचालय	१-९ वडा	६० लाख	१००	१००	
८.	मैलतडा पोखरा लिस्पानी चिनेकम्द सडक	शिवालय -८	३३ लाख ५० हजार	१००	१००	
९.	काँडागाउँ जरिकापानी सडक	शिवालय -६	३० लाख	९५	९३	
१०.	चुडा जांग्रे सिचाई कुलो	शिवालय -८	२० लाख	१००	१००	
११.	आले निमेली कोशेटाकुरा सडक निर्माण	शिवालय-१ र २	१ करोड	१०	९.१६	
१२.	शिवालय ताँगा चिउदुवा राख्म खनेटा सडक निर्माण	शिवालय- ३ र ४	१ करोड	२५	२२.१४	
कुल जम्मा			४ करोड ८७ लाख	४२.५	३४.१	



संघीय शसर्त अनुदान योजना



क्र.सं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	स्वीकृत रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१.	जुंगाथापचौर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	शिवालय -७	१ करोड ७० लाख	१००	९४	विशेष अनुदान
२.	कोल्डरोम सहितको कृषि उपच संकलन केन्द्र निर्माण	शिवालय -३	३० लाख	४५	४३	शसर्त अनुदान
३.	वडा कालभौरव मन्दिर निर्माण	शिवालय -७	१८ लाख	७५	७२	शसर्त अनुदान
४.	ढिकाले झोलुङ्गे पुल निर्माण	शिवालय ४-७	४५ लाख	१००	९०	शसर्त अनुदान
५.	माथिलल्लो वडाखेत झो.पु. निर्माण	शिवालय ६-७	५१ लाख	८०	५०	शसर्त अनुदान
कुल जम्मा			३ करोड १४ लाख	८०	७०.२	



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु



क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	स्वीकृत रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१.	नेरा मावि घेरावार निर्माण	शिवालय -१	३ लाख २० हजार	१००	१००	
२.	छेत्रपाल मन्दिर दुदेमष्टो मन्दिर र पोखरी निर्माण	शिवालय -२	४ लाख	१००	१००	
३.	सिचाइ पोखरी निर्माण राखमा	शिवालय -३	३ लाख २० हजार	९५	९३	
४.	तिमिले पाखा देखि चिउदुवा सम्मागोरेटो बाटो निर्माण	शिवालय ४	१ लाख ६० हजार	१००	१००	
५.	लामाघर गैरा देखि बाँजा सम्मा गोरेटो बाटो निर्माण र प्रताचौर मन्दिर निर्माण	शिवालय ५	३ लाख २० हजार	६५	६५	
६.	इन्द्र ज्योती मावि पाइपलाइन र मंकाल मन्दिर फिल्ड निर्माण	शिवालय ६	२ लाख ४० हजार	७५	७५	
७.	धारगाउँ मष्टा मन्दिर पहरिरा मष्टा मन्दिर निर्माण	शिवालय ७	४ लाख	१००	१००	
८.	मैलतडा पहुच मार्ग निर्माण	शिवालय ८	३ लाख २० हजार	१००	१००	
९.	मंकाल र मष्टा मन्दिर निर्माण	शिवालय ९	२ लाख ४० हजार	१००	१००	
कुल जम्मा			२७ लाख २० हजार	९२.७८	९२.५६	
			३४*१००=३४०० दिन रोजगारी सिर्जना	३१४८ दिन रो.सि. औषत ९३ दिन, ३४ जनालाई		



गाउँपालिका र WFP को साझेदारीमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम



क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	स्वीकृत रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१.	नेरा मावि सिस्ने दिवा खाजाघर निर्माण	शिवालय -१	७ लाख	१००	९८	
२.	सरस्वती आवि दिवा खाजाघर निर्माण	शिवालय -२	७ लाख	९५	९५	
३.	हिमालय आवि काउला दिवा खाजाघर निर्माण	शिवालय -५	७ लाख	१००	१००	
४.	नेरा आवि टाटे दिवाखाजाघर निर्माण	शिवालय ८	७ लाख	१००	१००	
कुल जम्मा			२८ लाख	९८.७५	९८.७५	

भूकम्प प्रतिरोधी आधुनिक भवन, सुधारीएको चुलो, बालमैत्री धारा समेत, ५४ वटा विद्यालयलाई भाडाकुँडा सहयोग।



कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू



- अस्थायी आवास निर्माण अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूलाई अनुदान वितरण भएको, ३११६/३२६०।
- सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तार भएको।
- पालिका केन्द्र देखि सबै वडा कार्यालयसम्म सडक संजाल जोडिएको, बाह्रै महिना चल्ने।
- चिया खेति/कफी खेतिको विस्तार तथा व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको।
- विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि भएको।
- दिगो विकास, जलवायु अनुकूल विकास तर्फ अग्रसर भएको।
- कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा तथा लक्षित कार्यक्रम संचालन भएको।
- कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा हाट बजार सञ्चालन भएको।
- शिवालय बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक संरचान निर्माण भएको।
- बस सेवा/एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन।
- रोजगारी सिर्जना।
- लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक/आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको।



आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादित उल्लेखनिय कार्यहरू



- टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन।
- चिया तथा कफि खेति विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन।
- स्थानीय पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन।
- WFP सँगको लागत साझेदारीमा बालमैत्री धाराको व्यवस्था सहितको दिवा खाजा घर निर्माण।
- मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन।
- LEOC स्थापना।
- बाल विवाह न्यूनिकरणको लागि जनचेतनामूलक सडक नाटक प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन।
- परम्परागत पेश प्रवर्द्धन एवं आय आर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन।
 - १५ दिने आरण सुधार तालिम
 - १५ दिने मादल निर्माण तालिम
 - २५ दिने सिलाई कटाई स्तरोन्नती तालिम
- १ महिने आधारभूत मगर भाषा कक्षा सञ्चालन।
- सामुदायिक बिउ बैंक सम्बन्धी तालिम तथा बिउ बैंक स्थापना।
- विपद् सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिको लागि कृतिम घटना अभ्यास कार्यक्रम।
- गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वय र साझेदारीमा विभिन्न परियोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन।



उल्लेखनिय कार्यहरु मध्ये अनुकरणीयकुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण

“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

पृष्ठभूमी

- LISP, BEK को आर्थिक सहयोग, कर्णालीका २० र लुम्बिनीका १५ गरी ३५ पालिकामा २०२९ सम्म लागू।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा LISP को लागि पालिका छनौट भएको।
- ९ वटा योजनामा LISP को १ करोड ६८ लाख र गाउँपालिकाको १ करोड ४० लाख गरी कुल ३ करोड ८ लाख बजेट पूर्वाधार विकासमा विनियोजन भई खर्च गरिएको।



उल्लेखनिय कार्यहरू मध्ये अनुकरणीयकुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण

“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

कार्यान्वयन

- स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको।
- सुधारिएको मोडालिटीको उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिएको।
- निर्माण सामग्री गाउँपालिकाबाट खरिद, कामदारहरूको बीमा र खातामा ज्याला रकम भुक्तानी गरिएको।
- उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन खर्च भुक्तानी गरिएको।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक सहायता DT Global संस्थाबाट प्राप्त।
- Feasibility Study, Detail Project Report, Project Information Board सबै योजनामा अनिवार्य लागू गरिएको।
- ३ चरणको अनुगमन, कामदारहरूको लागि Personal Protective Equipment हरूको व्यवस्था र कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको विषयमा अभिमुखिकरण गरिएको।
- कामको आधारमा ज्याला रकम भुक्तानी गरिएको।
- Bio-engineering सबै योजनामा लागू गरिएको।
- पालिकाको शासकीय क्षमता विकास (Governance Capacity Development) मा सहयोग।



उल्लेखनिय कार्यहरु मध्ये अनुकरणीयकुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण



“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

प्रगति

- ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति (कुल २ करोड ७८ लाख खर्च भएको), ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको।
- २७६६ मिटर पक्की सडक नाली निर्माण, ६५८ मिटर सिंचाई कुलो, १४९७.५ घनमिटर ग्याविन जाली, ३७ मिटर पक्की सडक (RCC) निर्माण भएको।
- कुल १२७०२ दिन रोजगारी सिर्जना, महिला ८४९१ दिन र पुरुष ४२११ दिन।
- दिगो र वातावरण मैत्री विकास पद्धतिको पालना भएको।



उल्लेखनिय कार्यहरु मध्ये अनुकरणीयकुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण



“स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मार्फत पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार”

सिकाई

- समयमै बजेट विनियोजन/ खरिद योजना निर्माण गरि योजना कार्यान्वयन गर्दा योजना सम्पन्न गर्न सहज हुने।
- योजना छनौट गर्दा माग र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता प्राप्त योजना छनौट गर्ने।
- सामाजिक-आर्थिक विकास, गरिबी, बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने, जलवायु जोखिम कम हुने योजना सञ्चालन गर्ने।
- दिगो विकासको मर्मलाई आत्मसाथ गरी विकास निर्माणका कार्य गर्ने।
- यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पद्धति पालिकाले सञ्चालन/निर्माण गर्ने अन्य योजनाहरुमा समेत अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने।



स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या



- स्रोत अभाव, बढ्दो दायित्व, न्यून आन्तरिक आय ।
- उच्च चालू खर्च ।
- कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था/क्षमता कमजोर ।
- बजेट विनियोजन र योजना छनौटमा समस्या ।
- कमजोर संस्थागत क्षमता ।
- वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको कमी ।
- जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या ।
- भौतिक पूर्वाधारको कमी । (All weather roads/Electricity/Communication)
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर ।
- समन्वय र सहकार्यमा कमजोरी ।
- सभा/कार्यपालिका/ अन्य समितिहरुको निष्कृयता ।
- बढ्दो बेरुजु/बेरोजगारी/बाँझो जमिन ।
- SD/Quality Development कमजोर ।
- जग्गा प्राप्तिको चुनौती ।



सङ्घीय सरकारसँग अपेक्षा



- आर्थिक स्रोतको वृद्धि ।
- क्षमता विकासमा सहयोग ।
- पूर्वाधार विकासमा सहयोग ।
- जिससको भूमिका/जिम्मेवारी बढाउने ।
- बजेट वनियोजन तथा योजना छनौटमा समन्वय ।
- प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सहयोग ।
- ठूला योजना प्रदेश/संघबाटै कार्यान्वयन ।
- कानून निर्माणमा सहयोग ।
- कर संकलनमा सहयोग ।
- अनुगमन प्रभावकारी बनाउने ।
- जिल्लामा गुणस्तर जाँच गर्ने निकायको व्यवस्था ।
- जग्गा प्राप्ति/बेरुजु फर्छ्यौटमा सहयोग ।
- संघीयता बलियो बनाउन जग बलियो बनाउँ ।

बालि उपचार शिविर, शिवालय-९



शिवालय गाउँपालिकाको कृषि मेला प्रदर्शनी, शिवालय-३




विधुतीय सेवा तर्फ बह्दै, शिवालय गाउँपालिका



डिजिटल नोटिस बोर्ड

2024.1.22 14:10

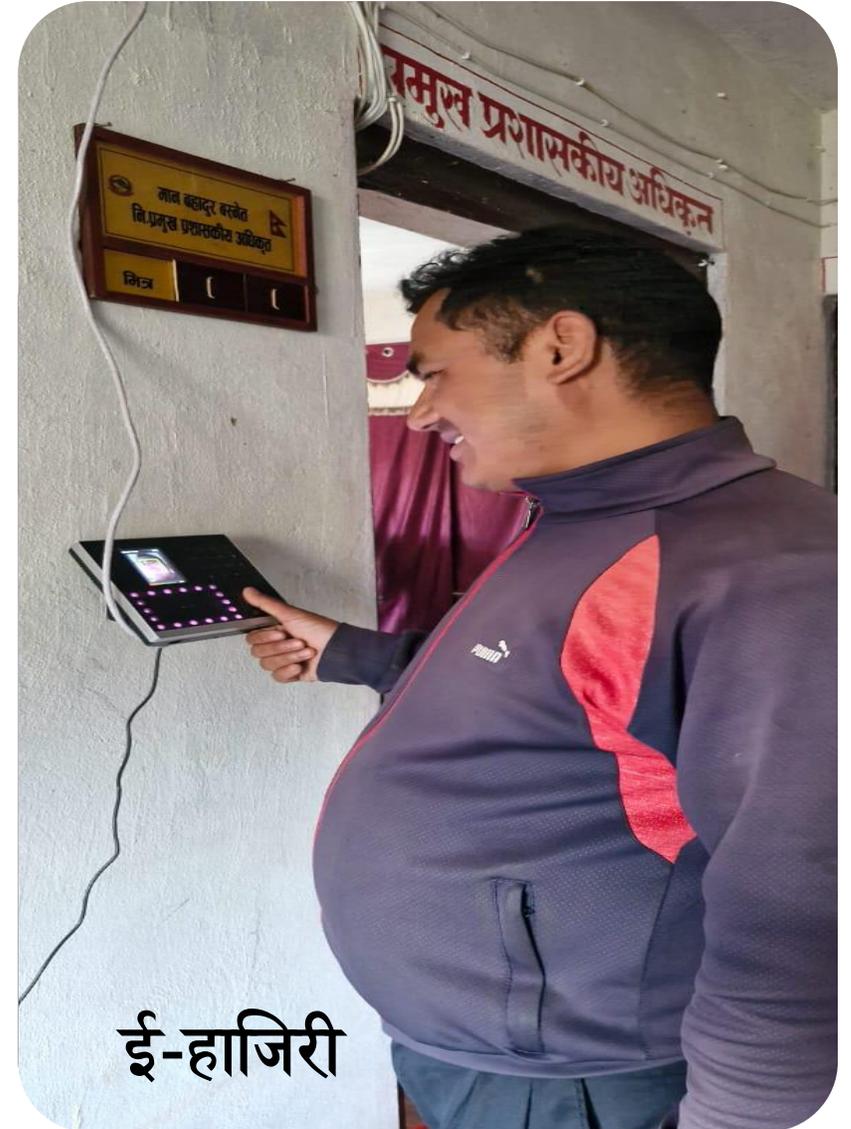

ई-हाजिरी

2024.1.22 14:10

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा जोड, शिवालय गाउँपालिका



वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा जोड, शिवालय गाउँपालिका



१० दिने जीवन उपयोगी र ४० दिने डकर्मी तालिम, शिवालय गाउँपालिका



१० दिने जीवनोपयोगी र ४० दिने डकर्मी तालिम सम्पन्न, शिवालय-३



शिवालय गाउँपालिकाको निर्माणाधिन १० शैया अस्पताल, शिवालय-३



शिवालय गाउँपालिकाको निर्माणाधिन १० शैया अस्पताल, शिवालय-३



विद्यालय अनुगमन, श्री सरस्वती मा.वि., शिवालय-३



शिवालय क्याम्पस भवन, प्रशासनिक भवन बन्दै, शिवालय-३



जुंगाथापाचौर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न, शिवालय-७



बालुवा बडाकाँडा सडक स्तरोन्नती योजना, शिवलाय ९

Before



After



उमाउरा टाटा सडक स्तरोन्नती योजनाऽ शिवालय, ३ र ४

Before

During Construction



उमाउरा टाटा सडक स्तरोन्नती योजना, शिवालय-३,४

Before



After



कोचिमुले लहरे सिंचाई कुलोनिर्माण आयोजना, शिवालय-६

Before



After



Kalyana Chinekumb Hudai Suyeda Road Upgrading-Shivalaya, 07

Before



After



Bhampa Aale Road Upgrading Scheme-Shivalaya, 01

Before



After



Maitada Lispani Road Upgrading Scheme-Shivalaya-08

Plum Concrete Drainage After Construction



Khaneta Deuli Road Upgrading Project, Shivalaya-2

Gabion Retaining wall after construction



Shivalaya Khaneta Road Upgrading Project, Shivalaya-2

During Construction



After construction



LISP तथा पालिकाको सह लगानिमा निर्माणधिन भम्प आले रोड
स्तरोन्नति PCC को काम हुँदै, शिवालय-१, जाजरकोट



दह भम्प डाफे खानेपानी योजना हेल्भेटास र पालिकाको साझेदारीमा RVT र घेराबारको काम सम्पन्न, शिवालय-१



किमिचौर पोखरी निर्माण, शिवालय-४



नव निर्मित विद्यालयको शौचालय नापजाँच गर्दै, शिवालय-३



हेल्भेटास र पालिकाको संयुक्त लगानिमा बन्दै गरेको खानेपानीको ईन्टेक, शिवालय-१



निर्माण सम्पन्न सिचाई पोखरी, शिवालय-७, जाजरकोट



निर्माण सम्पन्न सिचार्ड पोखरी, शिवालय-४, जाजरकोट



LISP तथा पालिकाको सह लगानिमा निर्माण सम्पन्न Maitada Lispani Road Upgrading Scheme-Shivalaya, 08



LISP तथा पालिकाको सह लगानिमा निर्माणधिन Baluwa Badakanda Road Upgrading Scheme-Shivalaya, 09



LISP तथा पालिकाको सह लगानिमा निर्माणधिन Baluwa Badakanda Road Upgrading Scheme-Shivalaya, 09



LISP तथा पालिकाको सह लगानिमा निर्माणधिन Baluwa Badakanda Road Upgrading Scheme-Shivalaya, 09



LISP तथा पालिकाको सह लगानिमा निर्माणधिन Baluwa Badakanda Road Upgrading Scheme-Shivalaya, 09 Monitoring and supervision palika team



निर्माणधिन सिचाई कुलो नापजाँच गर्दै, शिवालय-९, जाजरकोट



कागतिको बिरुवा वितरण, शिवालय गाउँपालिका-७, जाजरकोट



१० दिने सिलाई कटाई तालिम, शिवालय गाउँपालिका-६, टुनिबगर, जाजरकोट



मादल निर्माण, आरण सुधार र सिलाई कटाई तालिमको समापन, २०८१ शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट



शिवालय गाउँपालिकाका किसान स्तरिय ३ कार्यदिने कफि खेति प्रवर्द्धन तालिम, २०८१



जलवायुमैत्री कृषि प्रयोगात्मक सिकाई केन्द्र, ने.रा.मा.वि., स्यापि, शिवालय गा.पा.-१, जाजरकोट



छैटौं अध्यक्ष कप तथा पालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्गिशलड प्रतियोगिता, २०८१



चिया खेति विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरुलाई निशुल्क चियाको बिरुवा वितरण, शिवालय गा.पा.-८, जाजरकोट



खाँडो नाँच संरक्षणको लागि स्थानीय कला संरक्षण केन्द्र, शिवालय गा.पा.-८, जाजरकोटलाई ढाल तरवार सहयोग



मादल निर्माण तालिममा सहभागीहरुको हल्का रमाइलो !





धन्यवाद
